

ALLEGATO "A"

Comune di Popoli
Provincia di Pescara

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C2 DEL P.O. DI POPOLI

COMMITTENTE: ASL di Pescara.

CANTIERE: Via Enrico Brlinguer, Popoli (Pescara)

AVEZZANO, 19/04/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere D'Elia Simone)

per presa visione

IL COMMITTENTE


(Responsabile del procedimento Lo Mele Vincenzo)

Ingegnere D'Elia Simone

Via E. Mariani 1
67051 Avezzano (AQ)
Tel.: 3249546961 - Fax: -
E-Mail: -

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6											
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	7 g		Z1																																			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	7 g		Z1																																			
Scavo a sezione obbligata	9 g														Z1																							
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3 g																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3 g																																					
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g																																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	159 g																																					Z1
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita con r	7 g																																					
Taglio di solai in c.a.	7 g																																					
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano	7 g																																					
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5 g																																					
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccar	7 g																																					
Demolizione di tamponature eseguita a mano	12 g																																					
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	9 g																																					
Rimozione di manto di copertura in tegole	4 g																																					
Rimozione di manto impermeabile	3 g																																					
Rimozione di pavimento in ceramica	5 g																																					
Rimozione di rivestimenti in ceramica	4 g																																					
Rimozione di massetto	7 g																																					
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	3 g																																					
Rimozione di serramenti esterni	7 g																																					
Rimozione di serramenti interni	7 g																																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	9 g																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	9 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	9 g																																					
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	9 g																																					
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	9 g																																					
Realizzazione di tamponature	9 g																																					
Montaggio di porte interne	7 g																																					
Montaggio di serramenti esterni	7 g																																					
Impermeabilizzazione di coperture	3 g																																					
Posa di manto di copertura in tegole	9 g																																					
Realizzazione di opere di lattoneria	7 g																																					
Formazione intonaci interni (industrializzati)	17 g																																					

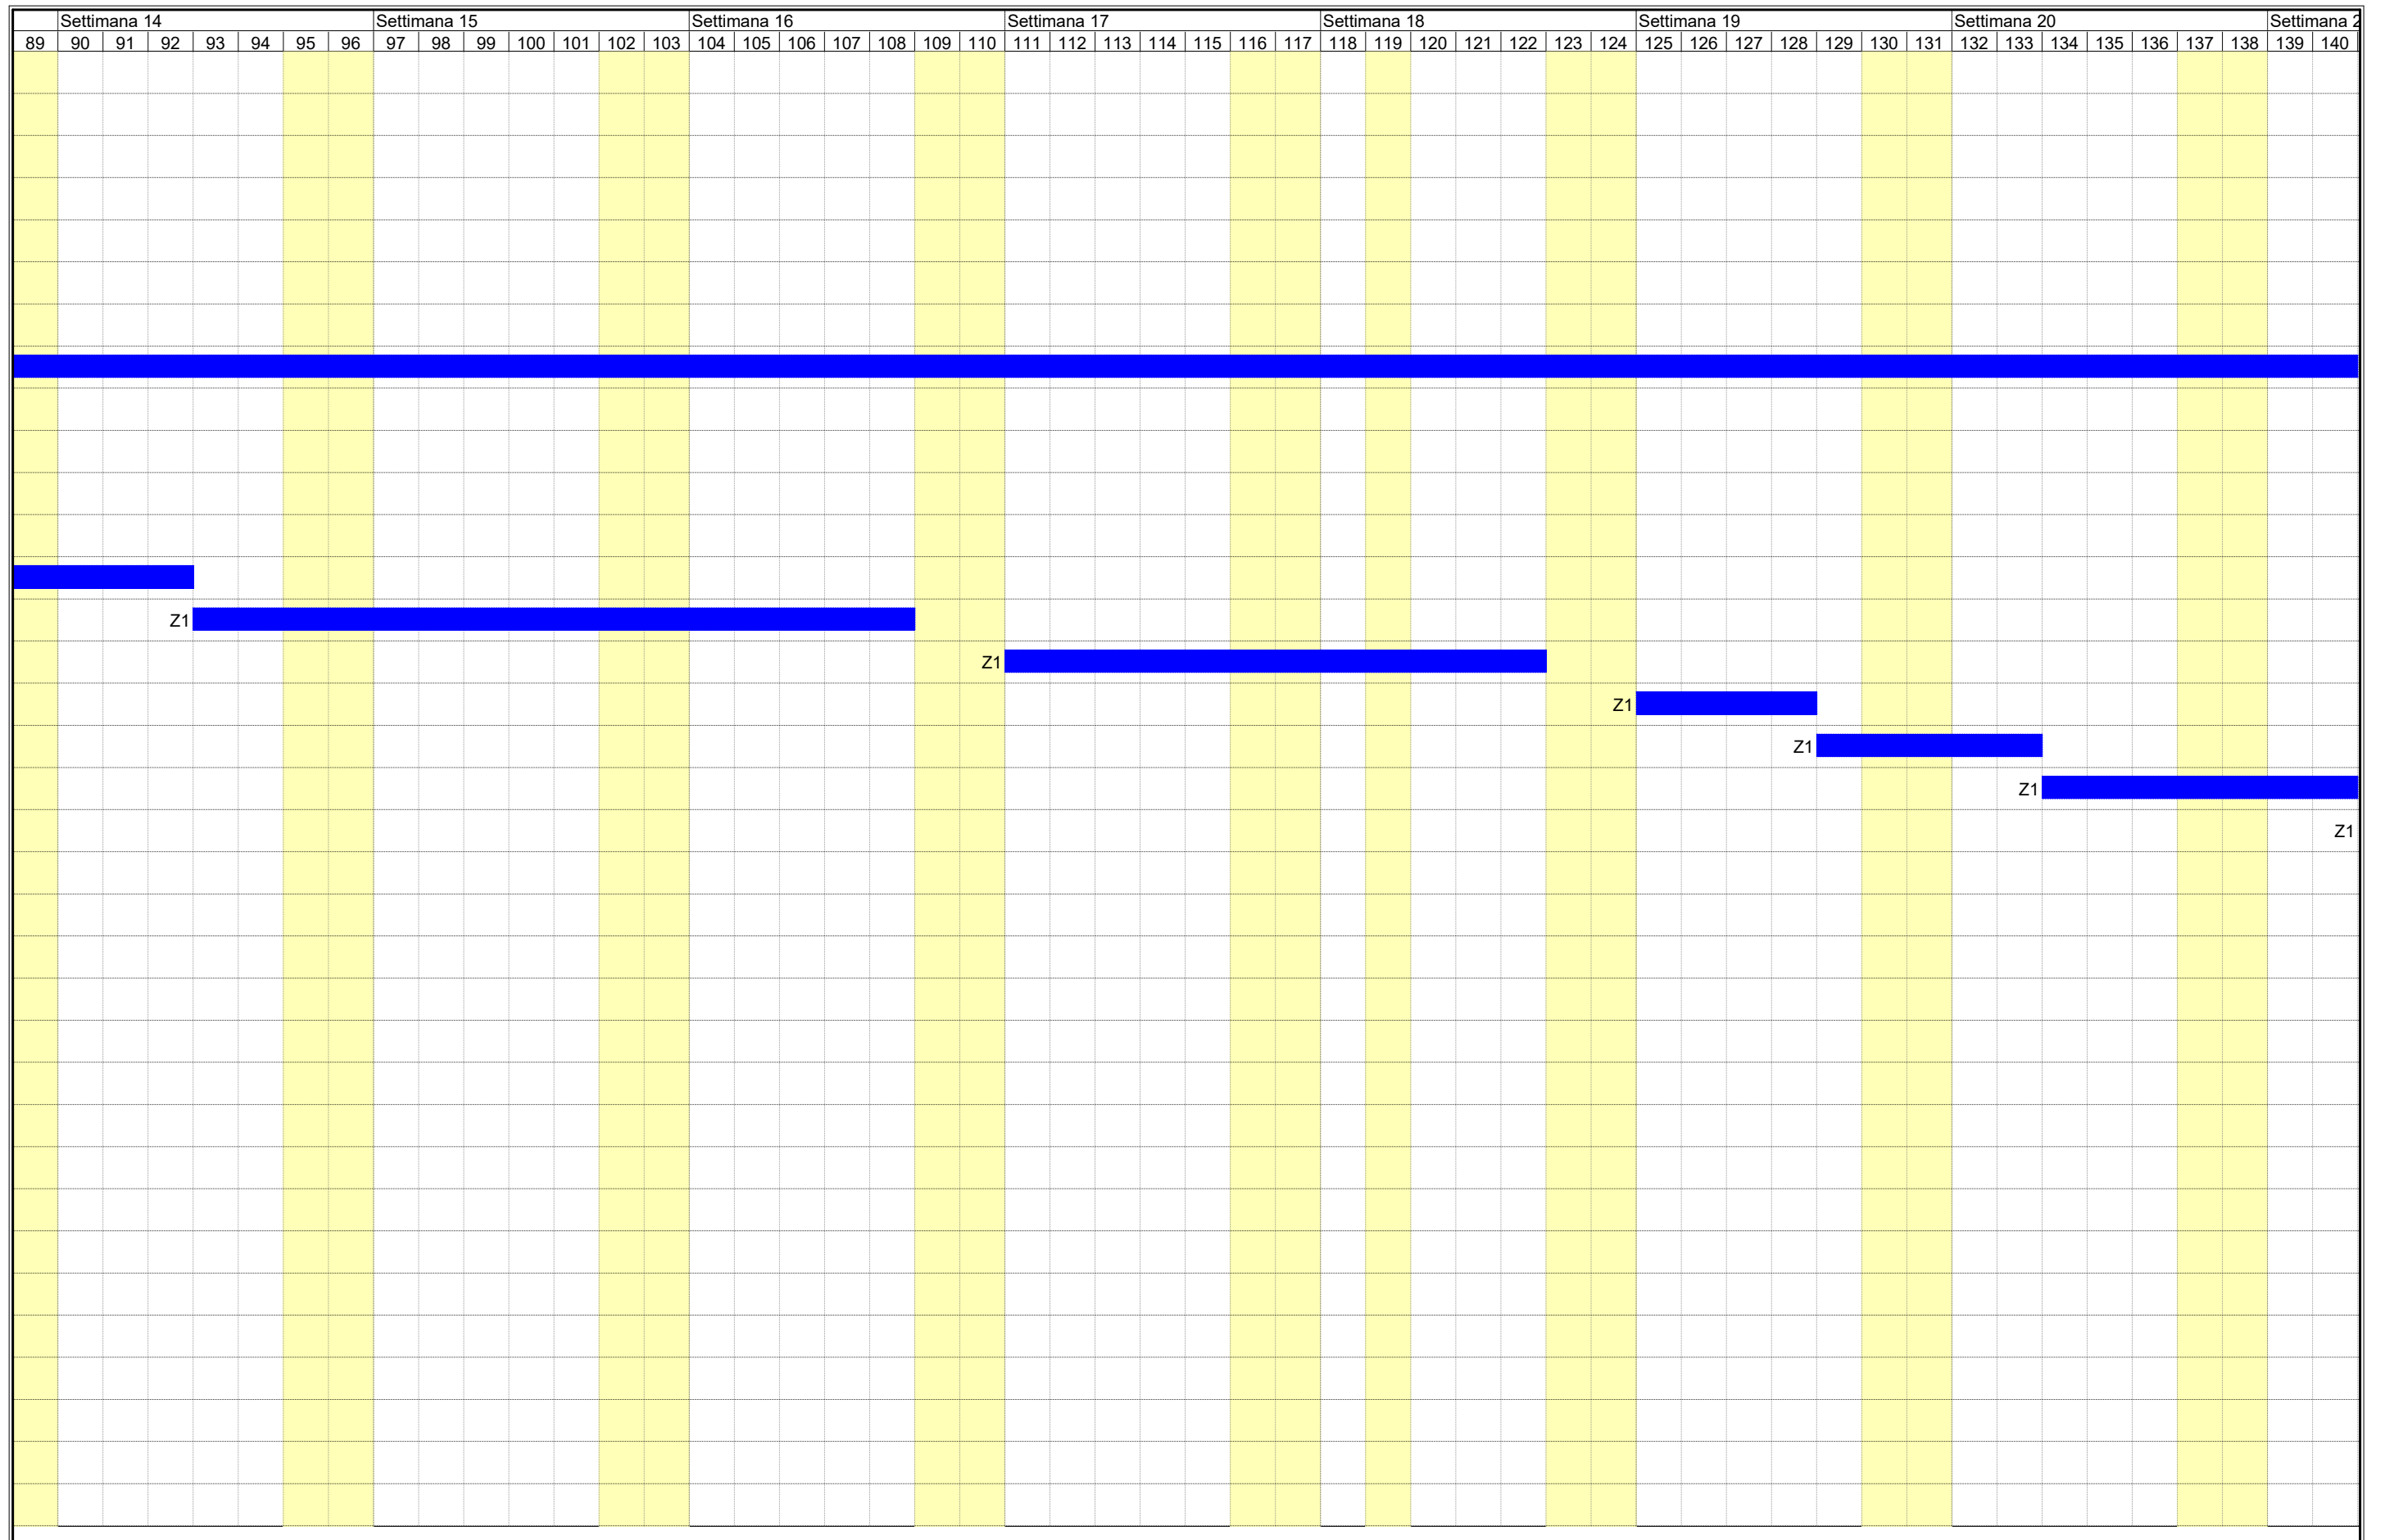

Settimana 36				Settimana 37				Settimana 38				Settimana 39				Settimana 40				Settimana 41				Settimana 42				Settimana 43																											
245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296				

