



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

MARZO 2016

Studio tecnico per l'edilizia
Ing. Roberto Calcagni

Pollenza (Mc) 62010

Via Campomaggio, 8

+39.0733.541799 +39.0733.541799

Località : **POPOLI (PE)**

Oggetto : **MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CORPO C2 DEL P.O. DI POPOLI**

Committente : **USL PESCARA -
U.O.C. SERVIZIO TECNICO PARTIMONIALE**


TAVOLA N.

M4

REV.	DATA
0	
1	
2	
3	
4	
-	

RAPP.

Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6										
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	8 g		Z1																																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	8 g		Z1																																			
Scavo a sezione obbligata	15 g													Z1																								
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	4 g																																				Z1	
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3 g																																					
Rinterro di scavo eseguito a macchina	4 g																																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	227 g																																					
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a ma	10 g																																					
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita con n	15 g																																					
Taglio di solai in c.a.	12 g																																					
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano	12 g																																					
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccar	8 g																																					
Demolizione di tompagnature eseguita a mano	16 g																																					
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	14 g																																					
Rimozione di manto di copertura in tegole	7 g																																					
Rimozione di manto impermeabile	5 g																																					
Rimozione di pavimento in ceramica	9 g																																					
Rimozione di pavimento in materie plastiche	6 g																																					
Rimozione di rivestimenti in ceramica	6 g																																					
Rimozione di massetto	11 g																																					
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	8 g																																					
Rimozione di serramenti esterni	9 g																																					
Rimozione di serramenti interni	9 g																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	14 g																																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	12 g																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	12 g																																					
Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di FRCC	48 g																																					
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	19 g																																					
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	19 g																																					
Consolidamento di tompagnatura con applicazione di FRCC	13 g																																					
Formazione di massetto per coperture	8 g																																					
Realizzazione di tompagnature	11 g																																					
Realizzazione di tramezzature interne	19 g																																					

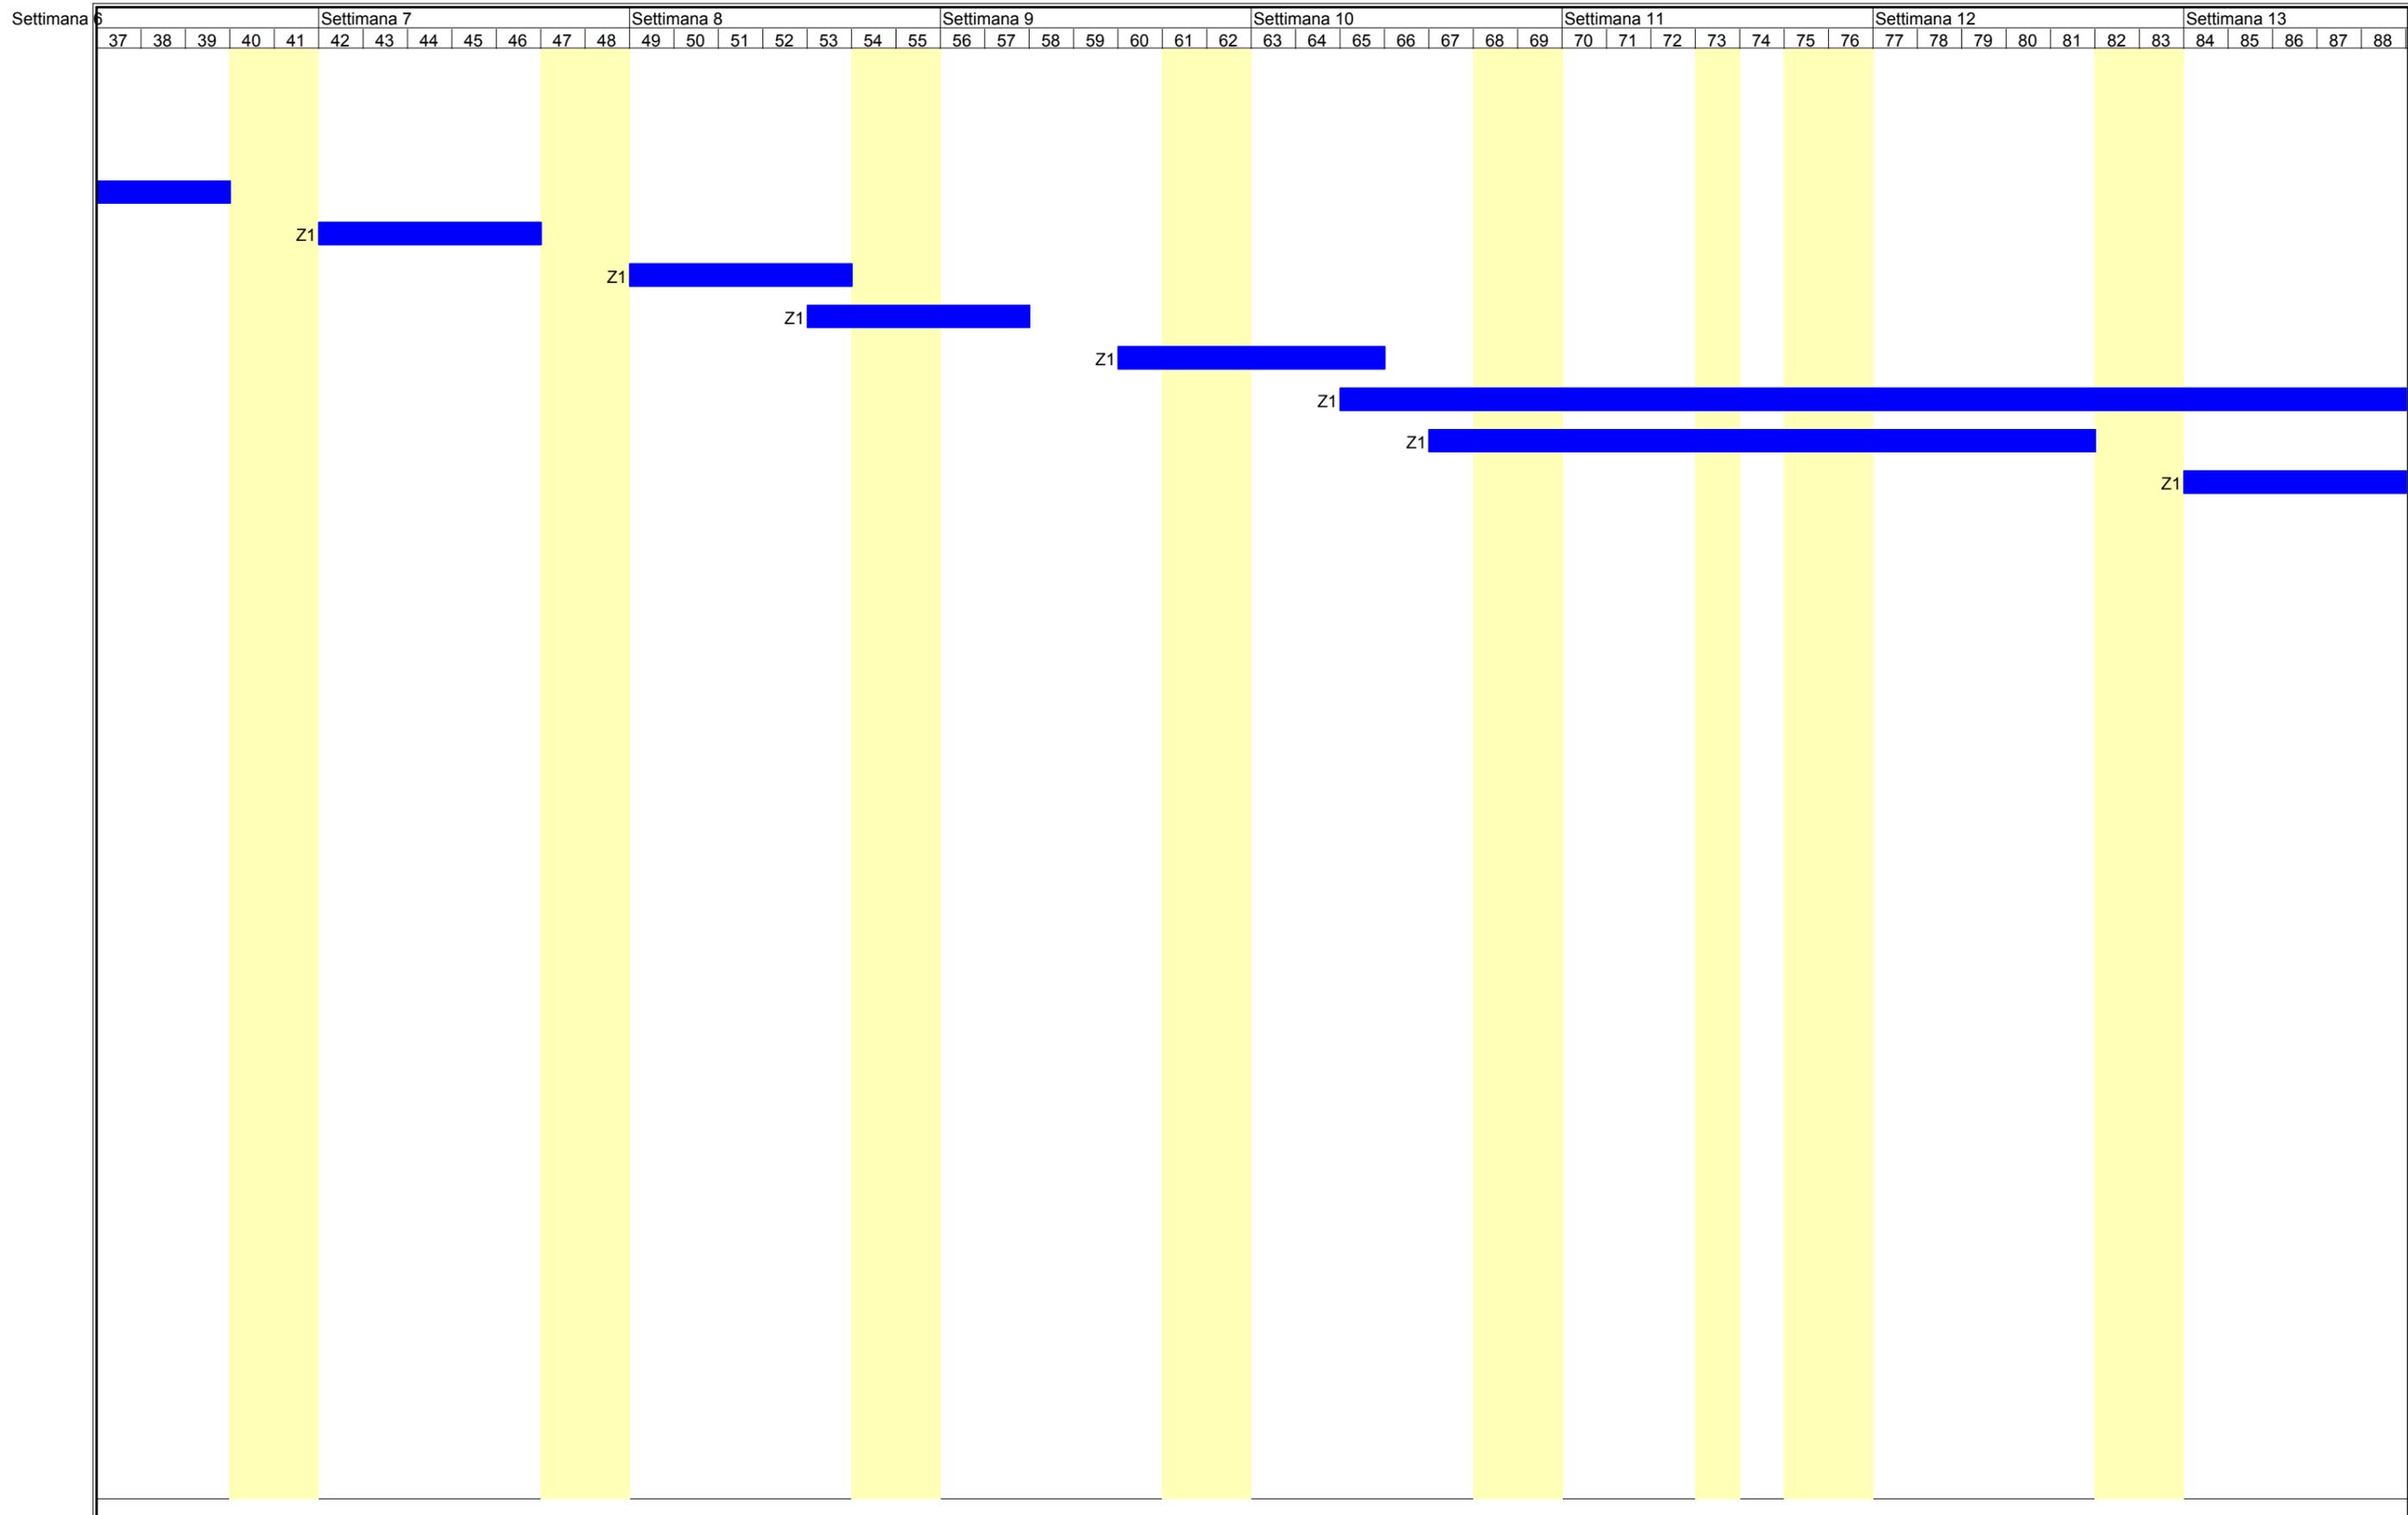

Settimana 14							Settimana 15							Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18							Settimana 19							Settimana 20							Settin		
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
							Z1																																												
							Z1																																												
											Z1																																								
																		Z1																																	
																									Z1																										

